



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



LES RENCONTRES DE LA FLOTTE Océanographique FRANÇAISE



LA PROGRAMMATION DES CAMPAGNES


*Comment se construit et se décide la
programmation des campagnes?*

Goulwen PELTIER – Responsable des opérations navales de la
Flotte Océanographique Française

Rémy BALCON – Directeur des opérations et de la logistique de
GENAVIR

Lundi 29 Mars 2021

Chronologie

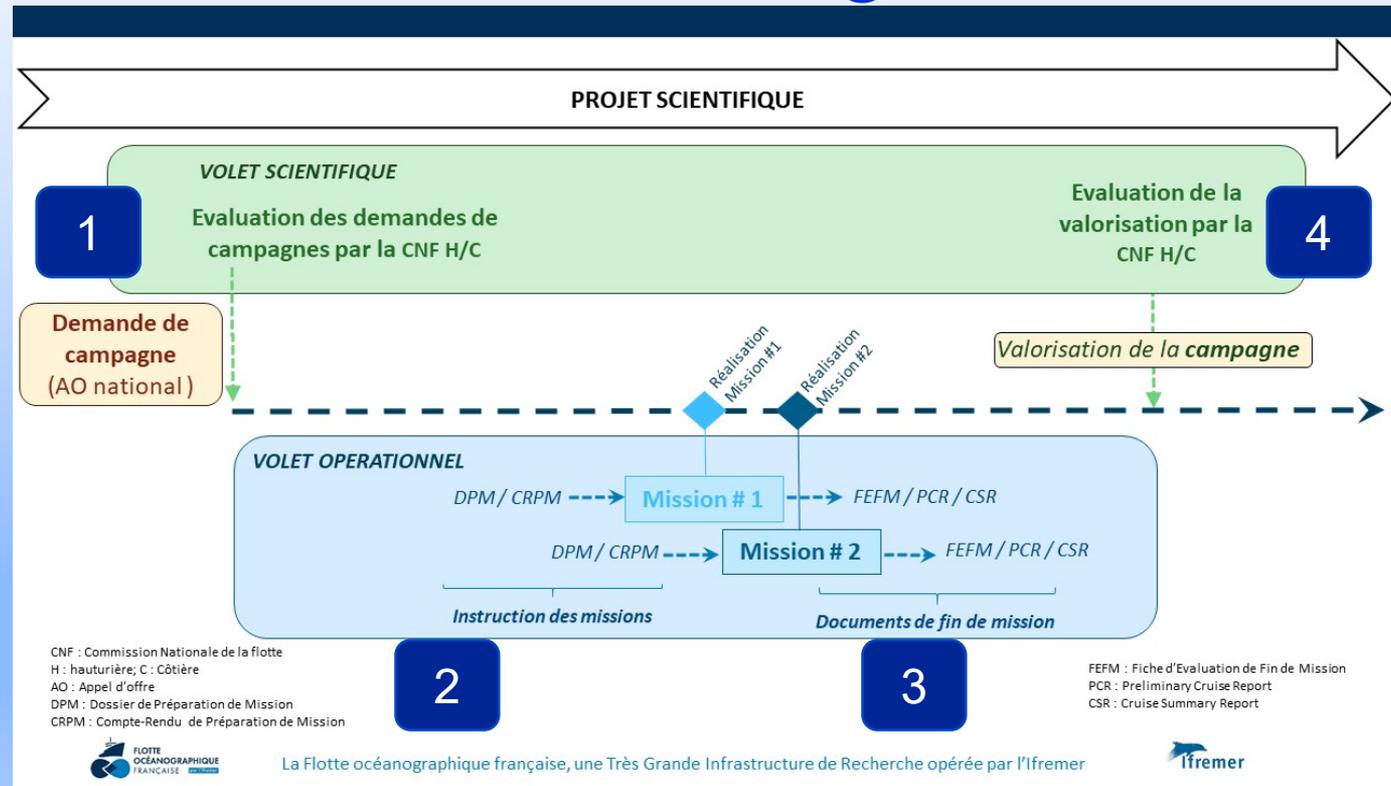

Phase 1

- Le dépôt du dossier de demande de campagne (DDC)
Lors d'un Appel d'Offre différencié hauturier / Côtier
À travers une interface informatique, le Système de Gestion des Campagnes (SGC)
- Une évaluation de son excellence scientifique par des Commissions Nationales de la Flotte dédiées
Un classement selon trois critères, P1, P2, non retenu
Une programmabilité de 1 à 3 ans

Phase 2

L'instruction, la programmation et la préparation des campagnes

Préciser dans les moindres détails l'ensemble des besoins entourant la campagne par des échanges très étroits avec le Chef de Mission

Anticiper, démarcher, s'assurer des conditions de réalisations à travers de multiples interlocuteurs étatiques et diplomatiques

Caler et articuler les besoins des scientifiques, de nos missions de service public et de nos partenaires dans une programmation générale de toute la Flotte : les missions

Négocier avec notre opérateur et filiale GENAVIR la réalisabilité de ces enchainements, dans un contexte budgétaire maîtrisé

Soumettre cette programmation à l'aval du Comité Directeur de la Flotte


2021	janv. 2021	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc. 2021
Pourquoi pas ?	SISMAORE	SISMAORE	CARAPAS 20	CARAPAS 20	GEOPLAMME	Transit PP 7 2021	Attente à qual PP 7 2020	Transit PP 7 2021	GHASS	ALBACORE	Attente à qual PP 7 2020	
L'Atlantique	ATTENTE qual	ATTENTE qual	SUNOS	PERLE4	Transit DATA 21	MOMARSAT 2021	Nanor			AT ATR 2021		
Thalassa	AT Thalassa 2021	IBTS 2021	PIRATA FR31	PELGAS 2021	MOOSE-GE 2021				COF82021	EVHOE 2021		
Marion Dufresne	SWINGS OIGO THEMISTO	OP-2021-01	SEZAM leg1	OP-2021-02	MAYOBS 2021-2	MAYOBS 2021-2	OP-2021-03	OP-2021-04				
Ailis	Attente à qual Ailis 2021		BICHEGALIS	FishCook	SPANDIOS	SPANDIOS	Attente à qual Ailis 2021	WARMAILS 2020	TT AL 21	TT ALIS 2021	MALIS 3	Attente à qual Ailis 2021
Antea	attente à qual Antea 2021		AT ANTEA 2021		PERCANTREX	CARESE	PEGUY	PEGUY	AMAZONEX	LINKS	attente à qual Antea 2021	AT ANTEA 2021
L'Europe	AT EU-2021	attente à qual EU-21			EU-21	CREDITS 2021	PELMED	IMPEC	attente à qual Europe 2021			attente à qual EU-21
Tethys 2	AT TT-2021			attente à qual TT-21		SUCHE Med 2021 - 2	WATER 2		JADO 2021		attente à qual TT-21	attente à qual TT-21
Thalia	Attente à qual Thalia		REGISTE 2021	CITRECALM 2020	attente à qual Thalia		COMOR2021	NURSE 2021	attente à qual Thalia	COSE2021	GEOPREST 2021	REGISTE 2021
Côtes de la manche	AT CDLM 2021				Attente à qual CDLM	PACMAN	Attente à qual CDLM		Attente à qual CDLM		SAGMA 2 Lag 1-2 2020	ORHAGO 21
Haliotis	Planification des Moyens Navals (PMN)											
Sarmiento de Gamboa												

<https://www.flotteoceanographique.fr/>
 La-Flotte-en-action/Calendriers/Calendriers-en-cours


Phase 2

- Une fois la programmation actée, la phase d'instruction se poursuit
 - Demandes d'autorisations de travaux en eaux étrangères - CNUDM
 - Etudes d'impact environnemental
 - Sécurité des opérations et de la navigation
- Dossier de préparation de mission (DPM)
 - Déclinaison des détails opérationnels des missions
 - Transmis à GENAVIR qui prend le relais en vue de la réalisation

Genavir - Phase 1

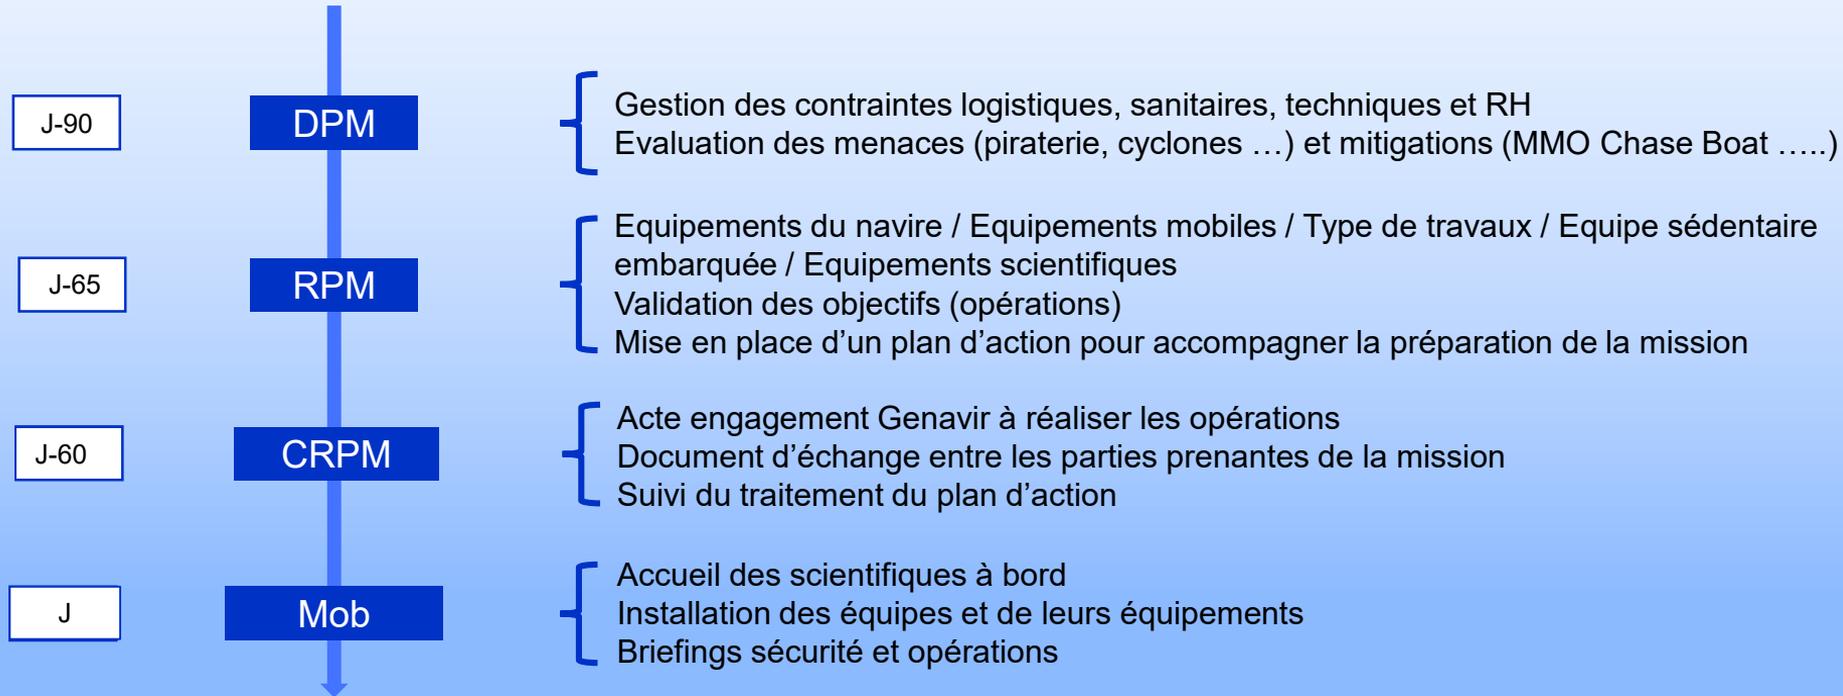

Genavir – Phase 2

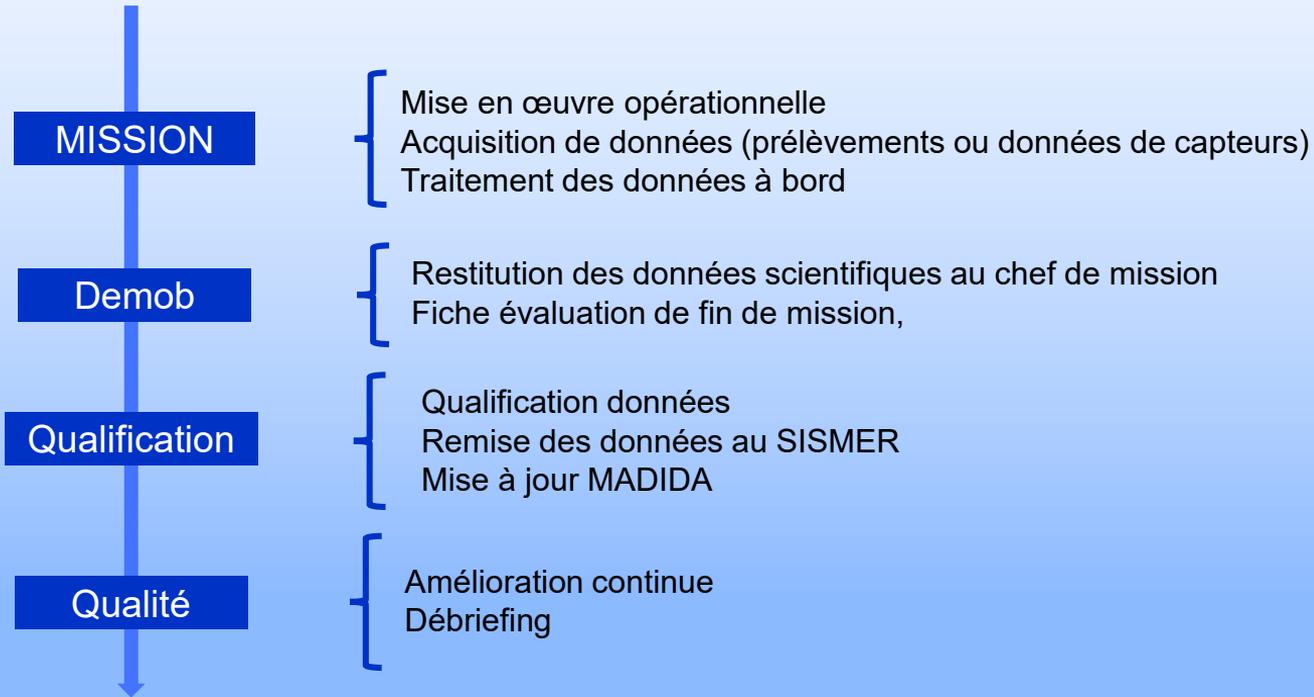


Phase 3

- Les documents de fin de mission
 - La Fiche d'Evaluation de Fin de Mission (FEFM)
 - La fiche diplomatique préliminaire de fin de mission (PCR)
 - Le rapport résumé de mission (CSR)
 - ...

Phase 4

- La valorisation de la campagne
 - Une valorisation 4 ans après la campagne

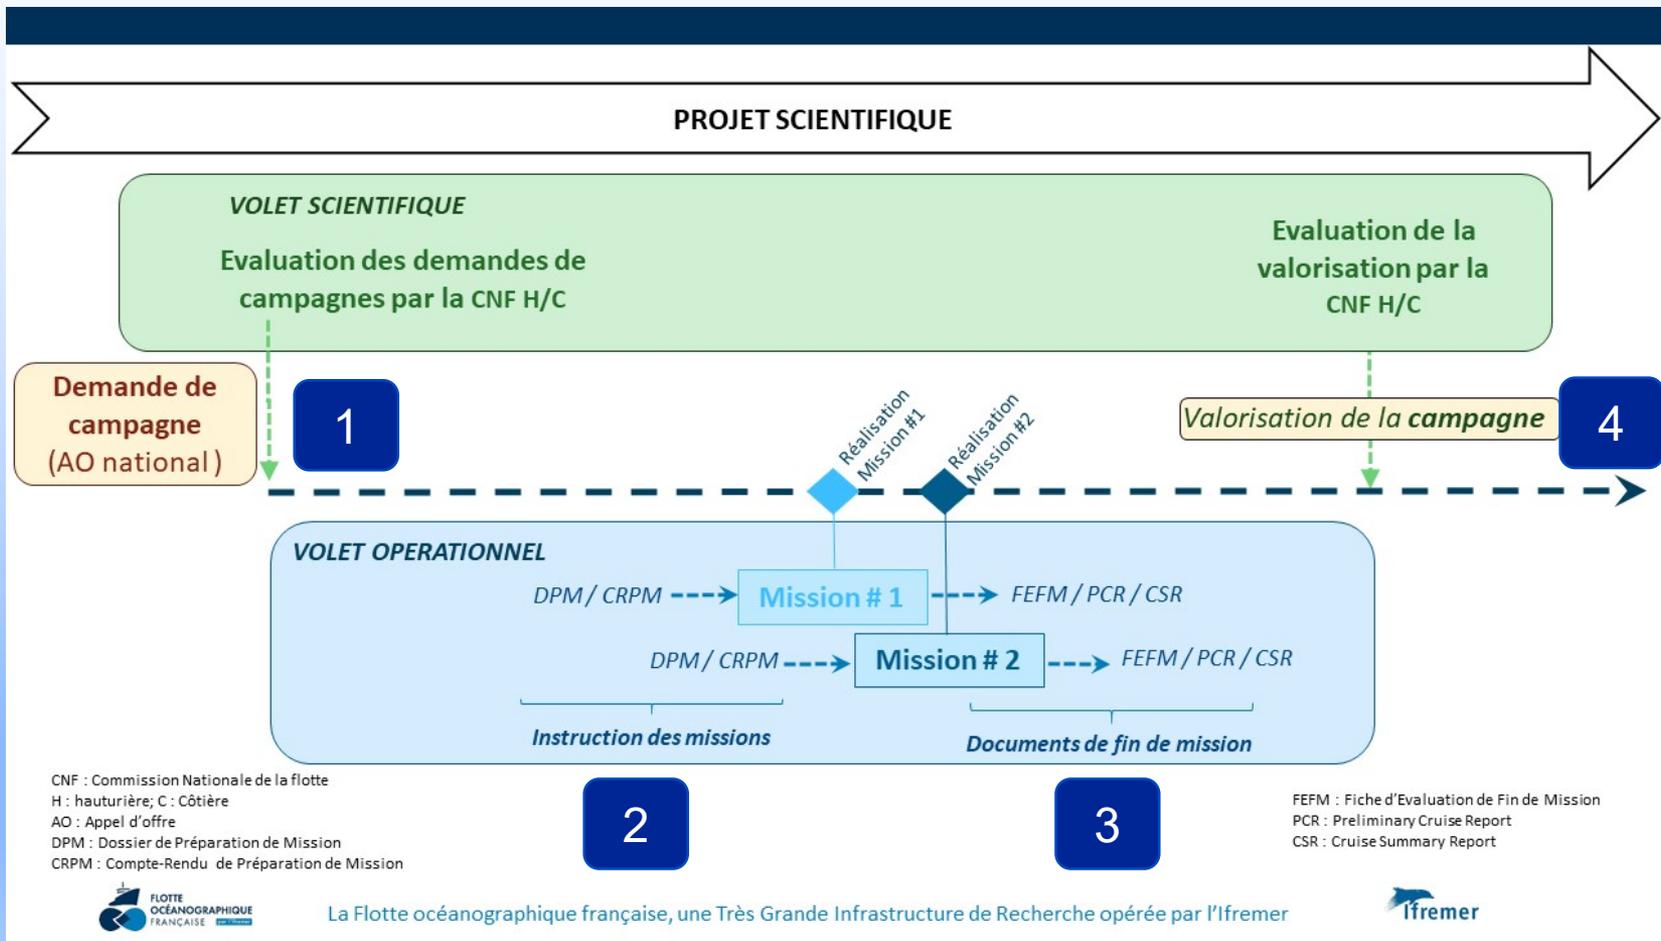

La Flotte océanographique française, une Très Grande Infrastructure de Recherche opérée par l'Ifremer



Merci de votre attention

- **A votre disposition pour répondre à vos questions:**

Goulwen PELTIER	Responsable des opérations navales de la Flotte Océanographique Française
Rémy BALCON	Directeur des opérations et de la logistique de GENAVIR
Nicolas ARNAUD	Directeur du CNRS
Aurélie FELD	Chargée d'opérations au P.O.N., en charge de L'ATALANTE et de l'ANTEA
Benoît ILDEFONSE	Président de la Commission Nationale Flotte Hauturière
Dominique LEFEVRE	Président de la Commission Nationale Flotte Côtière
